


CTP Architectes 2021  
Ordre des Architectes LR° S01312



COMPTE RENDU PV N° 8

PV

Date de la visite :

Mardi 02/11/2021

8

P1

Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS

IND.00

Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre  
34250 PALAVAS-LES-FLOTS

Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE

Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots

Marché n° : 21POR06

Maîtrise d'Ouvrage :

MAIL

TELEPHONE

Représenté par,

Mr Gabaudan

[dga@palavaslesflots.com](mailto:dga@palavaslesflots.com)

06 79 54 65 60

Mr Jeanjean

[portdepalavas@palavaslesflots.com](mailto:portdepalavas@palavaslesflots.com)

06 09 08 29 89

Mme Olivier

[audrey.olivier@palavaslesflots.com](mailto:audrey.olivier@palavaslesflots.com)

06 43 49 95 04

Architecte :

Mr Cascales

[cascales@architectes.org](mailto:cascales@architectes.org)

06 09 71 23 25

Coordonnateur SPS :

JMATEC

[jma@jmatec.fr](mailto:jma@jmatec.fr)

06 06 49 69 19

Coordinateur SSI :

SO

Bureau de Contrôle :

Mr Dadone

[clement.dadone@btp-consultants.fr](mailto:clement.dadone@btp-consultants.fr)

06 46 70 77 47

CONVOCATI  
n

Abs\*  
n

| LOT | INTERVENANT                                        | ENTREPRISE                           | MAIL                                                                           | TELEPHONE                        | ETAT | CONVOCATI<br>n | Abs*<br>n |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------|-----------|
| 1   | GROS ŒUVRE/FONDATION<br>Mr DELPAPA Régis           | Le MARCORY & AFR<br>DELMAS & LARIBAN | <a href="mailto:clermont@marcory.fr">clermont@marcory.fr</a>                   | 04 67 96 79 30<br>06 76 48 68 84 | Pre  | C              | 2         |
| 2   | CHARPENTE METALLIQUE<br>Mr MAROLLEAU Bertrand      | CMA                                  | <a href="mailto:bertrand.marolleau@cma34.com">bertrand.marolleau@cma34.com</a> | 04 67 78 17 80<br>07 77 00 48 23 | Pre  | C              |           |
| 3   | COUVERTURE / BARDAGE<br>Mr FERRIERE Laurent (IDEM) | CMA                                  | <a href="mailto:bertrand.marolleau@cma34.com">bertrand.marolleau@cma34.com</a> | 04 67 78 17 80<br>06 25 35 08 40 | Pre  | C              |           |
| 4   | MENUISERIES ALU.<br>Mr MOUNITION Christian         | FRANCE ALUMINIUM                     | <a href="mailto:france.aluminium@wanadoo.fr">france.aluminium@wanadoo.fr</a>   | 04 90 22 19 88<br>06 12 34 06 91 | Exc  | C              | 2         |
| 5   | PLATRERIE / Aménag. Int.<br>Mr PELISSOU Gilles     | SODAC                                | <a href="mailto:contact@sassodac.fr">contact@sassodac.fr</a>                   | 04 67 03 38 38                   | Exc  | C              | 1         |
| 6   | PLOMBERIE & CVC<br>Mr BOSC Anthony                 | CAMBORDE En.34                       | <a href="mailto:abosc.ce34@gmail.com">abosc.ce34@gmail.com</a>                 | 06 79 21 63 21<br>06 81 98 95 52 | Exc  | C              |           |
| 7   | ELECTRICITE & SSI<br>Mr GAYRAUD Eric               | GAYRAUD                              | <a href="mailto:contact@gayraud-elec.fr">contact@gayraud-elec.fr</a>           | 04 67 59 47 10<br>06 12 35 63 04 | Exc  | C              |           |
| 8   | ASCENSEUR<br>Mr CROS Guilhem                       | CFA Division NSA                     | <a href="mailto:Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr">Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr</a> | 04 90 81 11 50<br>06 61 68 44 04 | Pre  | C              | 5         |
| 9   | SERRURERIE<br>IDEM Lot 02 & Lot 03                 | CMA                                  | <a href="mailto:bertrand.marolleau@cma34.com">bertrand.marolleau@cma34.com</a> |                                  | Pre  | C              |           |
| 10  | SOLS / MUR & PEINTURE                              | En cours                             |                                                                                |                                  |      |                |           |
| 11  | INSTALLATION PV<br>Mr HASNI Mohamed                | EDISON                               | <a href="mailto:m.hasni@edison-energies.com">m.hasni@edison-energies.com</a>   | 04 67 64 07 07<br>07 63 64 96 44 | Esc  | C              | 4         |
| 12  | PLATELAGE Ext.                                     | En cours                             |                                                                                |                                  |      |                |           |
| 13  | FACADE                                             | En cours                             |                                                                                |                                  |      |                |           |

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé NC - Non convoqué C - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier \*

Abs\*  
n

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

## CONVOCACTION N° 9

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 08 NOVEMBRE 2021 à 14:30

COMPTE RENDU PV N° 8

Semaine de préparation n°08 : du 02 au 05 novembre 2021 / Semaine n°44

|           |                                                                                                          |                                                                                                                           |           |        |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| 01        | ► <b>MOA :</b>                                                                                           |                                                                                                                           |           |        |               |
| 02        | DIAGNOSTIC > CLIM R+1 : 2 climatiseurs sur 5 opérationnels                                               |                                                                                                                           |           |        |               |
| 03        | <u>Devis en attente de décision :</u>                                                                    | Entreprise VIOLAN / Lot 10 - Revêtements sols & murs                                                                      |           |        |               |
| 04        |                                                                                                          | Entreprise Le Marcory / Lot 10 - Chape de remplissage R+1                                                                 |           |        |               |
| 05        |                                                                                                          | Entreprise NSA Division CFA / Kit GSM                                                                                     |           |        |               |
| 06        |                                                                                                          | Entreprise GAYRAUD Lot 07 / option goulotte extérieure                                                                    |           |        |               |
| 07        | ► <b>PIC :</b>                                                                                           | PIC ind C / En attente avec :                                                                                             |           |        |               |
| 08        |                                                                                                          | - Faire apparaître les modules de l'accueil provisoire sur PIC (conflit de limite)                                        |           |        |               |
| 09        |                                                                                                          | - Gestion de la distribution verticale chantier R+1 > R+2                                                                 |           |        |               |
| 10        |                                                                                                          | - Position du panneau de chantier                                                                                         |           |        |               |
| 11        |                                                                                                          | - Avancer l'aire de livraison devant les bennes, suivant les recommandation du CSPS                                       |           |        |               |
| 12        | ► <b>PLANNING :</b>                                                                                      | Rétro-planning ou délai d'intervention par tâche                                                                          |           |        |               |
| 13        |                                                                                                          | <table border="1"> <tr> <td>CMA Lot 3</td> <td>EDISON</td> <td>CFA Ascenseur</td> </tr> </table>                          | CMA Lot 3 | EDISON | CFA Ascenseur |
| CMA Lot 3 | EDISON                                                                                                   | CFA Ascenseur                                                                                                             |           |        |               |
| 14        |                                                                                                          | Retro planning en cours d'élaboration DET/OPC IND 00 > VOIR annexe<br>Programme pour les 6 semaines à venir :             |           |        |               |
| 15        | ► <b>IMPLANTATION</b>                                                                                    |                                                                                                                           |           |        |               |
| 16        | <b>Le Marcory / aceb</b> > Plans d'implantation des pieux (Appuis CMA 10 & 11) avec longrines en console |                                                                                                                           |           |        |               |
| 17        | <b>Le Marcory</b> > En attente du marquage contradictoire                                                |                                                                                                                           |           |        |               |
| 18        | <b>Le Marcory</b> > Implantation et marquage au sol des aménagements VRD                                 |                                                                                                                           |           |        |               |
| 19        | <b>CMA</b> > Mise à jour de l'appui n°2 pour évitement réseau assainissement / > Prévu le 04/11          |                                                                                                                           |           |        |               |
| 20        | <b>MOE</b> > Altimétrie des massifs de fondation définit par appui en annexe                             |                                                                                                                           |           |        |               |
| 21        | ► <b>FONDATIIONS</b>                                                                                     |                                                                                                                           |           |        |               |
| 22        | <b>Le Marcory / aceb</b> > En attente du dimensionnement des massifs de fondation pour VISA              |                                                                                                                           |           |        |               |
| 23        | <b>MOE</b> > Plan EXE du RDC en annexe (+ Format dwg)                                                    |                                                                                                                           |           |        |               |
| 24        | ► <b>ETAT D'AVANCEMENT DES DOSSIERS EXE et autres documents</b>                                          |                                                                                                                           |           |        |               |
| 25        | ► <b>LOT 01 :</b>                                                                                        | IDEM PV7 / En attente des modes opératoires des démolitions au R+1 pour validation SPS                                    |           |        |               |
| 26        | ► <b>LOT 02 :</b>                                                                                        | En cours... Prise en compte des premiers VISA de conformité VL01-01 & VL02-01 (Altimétrie têtes de pieux & NDC Structure) |           |        |               |

|    |                   |                                                                                                                                                          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | ► <b>LOT 03 :</b> | En attente de la décennale à jour + retro planning & mode opératoire.                                                                                    |
| 28 | ► <b>LOT 04 :</b> | DEMANDE DE PRECISION PLAN INCOMPLET en attente (Art. 2.3 et 2.4 CCTP)<br>En attente des fiches produits au format papier -                               |
| 29 | ► <b>LOT 05 :</b> | Documents techniques fournis. VISA (MOE SPS, CT & CSPS) et agrément MOA en cours de préparation.                                                         |
| 30 | ► <b>LOT 06 :</b> | Documents techniques fournis et en cours d'élaboration concernant clim et VMC R+1.<br>VISA (MOE SPS, CT & CSPS) et agrément MOA en cours de préparation. |
| 31 | ► <b>LOT 07 :</b> | En attente du dossier technique des fiches produits (pdf & format papier)<br>>>>> VARIANTE Goulotte extérieure à définir                                 |
| 32 | ► <b>LOT 08 :</b> | Documents techniques fournis. VISA (MOE SPS, CT & CSPS) et agrément MOA en cours de préparation. En attente rétro planning & décennale                   |
| 33 | ► <b>LOT 09 :</b> | En attente du dossier technique des fiches produits (pdf & format papier)<br>>>> VARIANTE Garde-corps à définir                                          |
| 34 | ► <b>LOT 10 :</b> | En attente décision MOA<br>Offre de l'entreprise VIOLAN avec Le MARCORY en sous-traitant                                                                 |
| 35 | ► <b>LOT 11 :</b> | En attente du dossier technique des fiches produits (pdf & format papier)                                                                                |
| 36 | ► <b>LOT 12 :</b> | Offre CMA concernant le platelage / PREVUE LE 08/11                                                                                                      |

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| <b>A</b> | ► <b>DOCUMENTS ANNEXES</b>               |
| 37       | > <i>Rétro planning DET/OPC ind 00</i>   |
| 38       | > <i>Altimétrie massifs de fondation</i> |
| 39       | > <i>Plan EXE RDC</i>                    |

|                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                       |             |
| <a href="https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fq9zcsC9">https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fq9zcsC9</a> |             |
|                                                                                                       | PHOTOS du : |


|  |                                |                  |  |
|--|--------------------------------|------------------|--|
|  |                                |                  |  |
|  |                                |                  |  |
|  | VISA :                         |                  |  |
|  | FICHE D'AGREMENT DE PRODUIT N° |                  |  |
|  |                                | Réception (date) |  |
|  |                                | Avis architecte  |  |
|  |                                | Avis contrôle    |  |
|  |                                | Avis MO          |  |

RETOPLANNING


DET / OPC

IND 00

| Lot(s) | 62  | Délai       | Date de début | Date de fin | 6.2 - Délai d'exécution                                                          |
|--------|-----|-------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Lot 1  | 10  | 10 semaines | 06/09/2021    | 24/12/2021  | Le délai prévisionnel propre à la période de préparation est donc de 6 semaines. |
| Lot 2  | 9,5 | 12 semaines | 18/10/2021    | 10/12/2021  |                                                                                  |
| Lot 3  | 20  | 7 semaines  | 20/09/2021    | 17/12/2021  |                                                                                  |
| Lot 4  | 2   | 3 semaines  | 02/11/2021    | 23/11/2021  | Le délai prévisionnel d'exécution propre à chaque lot est de :                   |
| Lot 5  | 7   | 4 semaines  | 13/12/2021    | 07/01/2022  |                                                                                  |
| Lot 6  |     | 4 semaines  | 20/09/2021    | 28/01/2022  |                                                                                  |
| Lot 7  |     | 4 semaines  | 20/09/2021    | 28/01/2022  |                                                                                  |
| Lot 8  |     | 3 semaines  | 15/11/2021    | 28/01/2022  |                                                                                  |
| Lot 9  | 3   | 4 semaines  | 29/11/2021    | 24/12/2021  |                                                                                  |
| Lot 10 | 7   | 7 semaines  | 29/11/2021    | 28/12/2021  |                                                                                  |
| Lot 11 | 4   | 4 semaines  | 08/11/2021    | 28/12/2021  |                                                                                  |

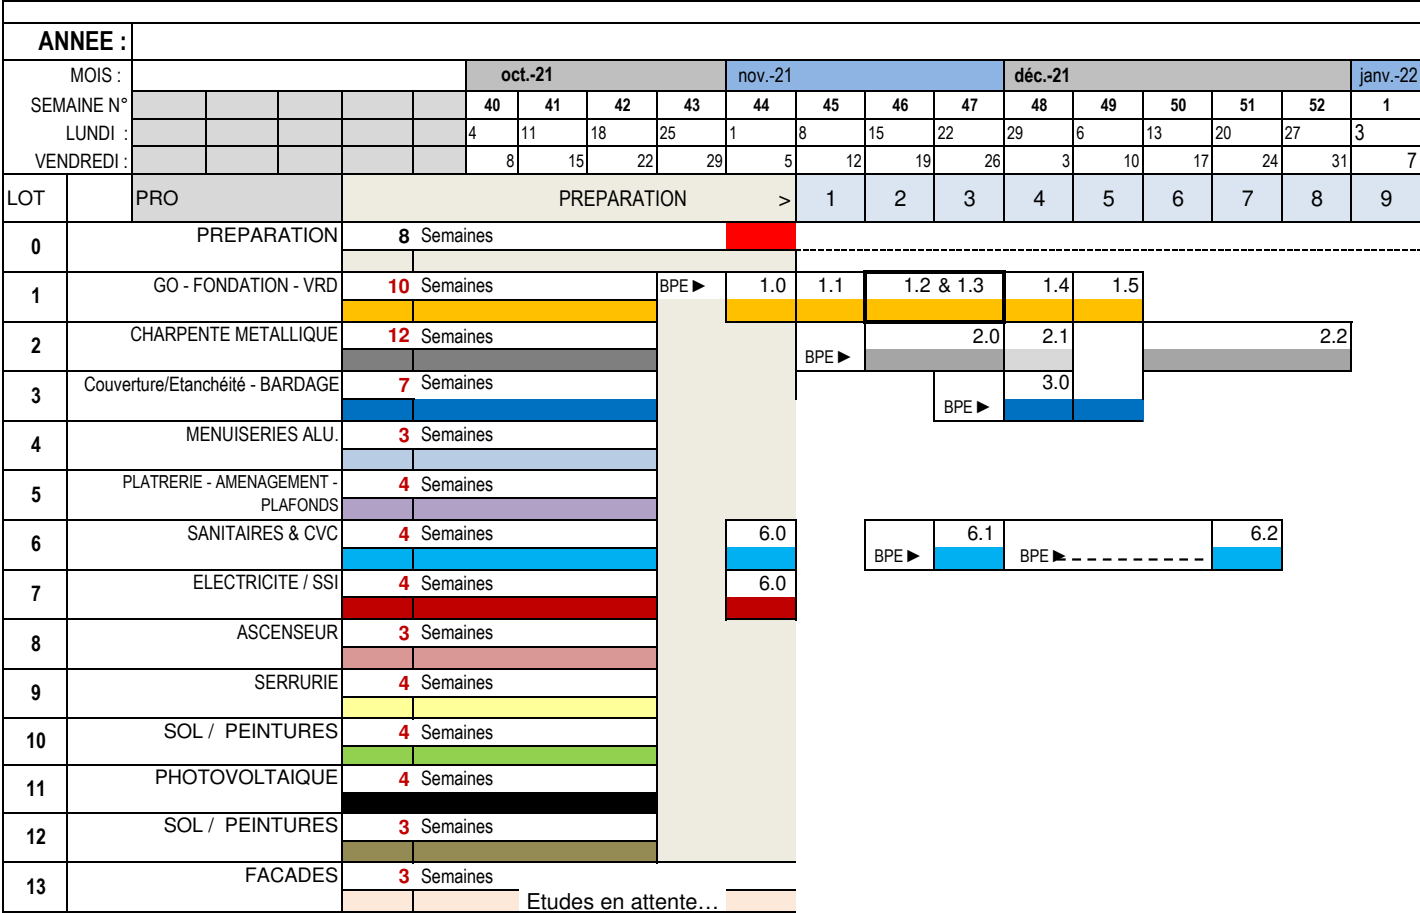

|    |     |                                                                              |     |                                  |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 44 | 1.0 | ▶ INSTALLATION CHANTIER                                                      |     |                                  |
|    |     | 1 SEMAINE : du 02 au 05/11                                                   |     |                                  |
| 45 | 1.1 | ▶ Démolition VRD & Escalier / Préparation pour fondation                     | 2.0 | ▶ IMPLANTATION RDC & R+2         |
|    |     | 1 SEMAINE : du 08 au 12/11 + Terrassement & dévoiement réseau assainissement |     | 1 SEMAINE : du 08 au 12/11       |
| 46 | 1.2 | ▶ Le MARCORY / Découpe garde-corps R+1 et Carottages (R+2)                   | 2.1 | ▶ Façonnage charpente en atelier |
|    |     | 1 SEMAINE : du 15 au 19/11                                                   |     | 2 SEMAINES : du 15 au 26/11      |
| 47 | 1.3 | ▶ AFR / Mise en œuvre Micropieux                                             | 6.1 | ▶ Dépose CLIM R+1                |
|    |     | 2 SEMAINES : du 15 au 26/11                                                  |     | 1 SEMAINE : du 22 au 26/11       |
| 48 | 1.4 | ▶ Massifs, Longrines et radiers de fondation                                 |     |                                  |
|    |     | 1 SEMAINE : du 29/11 au 03/12                                                |     |                                  |
| 49 | 1.5 | ▶ Découpe accotères R+2                                                      | 2.1 | ▶ Galvanisation à chaud          |
|    |     | 1 SEMAINE : du 06/12 au 10/12                                                |     |                                  |
|    | 2.2 | ▶ Pose charpente                                                             |     |                                  |
| 50 |     |                                                                              |     |                                  |

|                                                         |                                                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Opération : <i>ELEVATION DE LA CAPITAINERIE</i>         |  | <h1>VISA DE CONFORMITE ARCHITECTURALE</h1> |
| Adresse : <i>Port de plaisance de Palavas-les-Flots</i> |                                                                                   |                                            |
| Marché n° : <i>21POR06</i>                              |                                                                                   |                                            |
| Reçu le : 07/10/2021                                    |                                                                                   |                                            |

Visé le : *mercredi 3 novembre 2021*

IND 01

Tableau récapitulatif page 22/24 -NDC1indA MIC21B14850 Micropieux-  
EXTRAIT NOTE DE CALCUL N°1 / Entreprise AFR

Lot 01 GO / FONDATION

Visa n° VL01-01 ind 01

| Appuis    | ø    | Longueur forage | Hauteur supérieure des massifs de fondation, longrines et radier ascenseur         |
|-----------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-A       | 0,15 | 10,60           | Niv.- 50 cm/ NE (Niveau Existant : Carrelage du perron de l'accueil)               |
| 1-B       | 0,15 | 10,60           | IDEM                                                                               |
| 1-C       | 0,15 | 10,60           | IDEM                                                                               |
| 2         | 0,2  | 9,50            | SOUS RESERVE de l'implantation et de la dimension de la tête de pieux              |
| 3         | 0,15 | 5,30            | Niv.- 30 cm/ NE (Niveau Existant : trottoir de vigilance PMR / pavés autobloquant) |
| 4-A       | 0,15 | 12,90           | Niv.+10 cm/ NE (Niveau Existant : Carrelage du perron de l'accueil)                |
| 4-B       | 0,15 | 12,90           | IDEM                                                                               |
| 4-C       | 0,15 | 12,90           | IDEM                                                                               |
| 5         | 0,15 | 12,50           | Niv.- 15 cm/ NE (Niveau Existant : pavés autobloquant & dallage béton)             |
| 6         | 0,15 | 11,20           | IDEM                                                                               |
| 7         | 0,15 | 10,70           | IDEM                                                                               |
| 10        | 0,15 | 4,50            | Niv.- 30 cm/ NE (Niveau Existant : trottoir de vigilance PMR / pavés autobloquant) |
| 11        | 0,15 | 4,50            | Niv.- 30 cm/ NE (Niveau Existant : pavés autobloquant)                             |
| 12        | 0,15 | 5,50            | Niv.- 40 cm/ NE (Niveau Existant : Rampe PMR)                                      |
| (13+14)-A | 0,15 | 4,50            | Niv.- 30 cm/ NE (Niveau Existant : pavés autobloquant)                             |
| (13+14)-B | 0,15 | 4,50            | IDEM                                                                               |
| (17+18)   | 0,15 | 8,50            | IDEM                                                                               |
| ASC4      | 0,15 | 4,50            | Niv.- 15 cm/ NE (Niveau Existant : pavés autobloquant & dallage béton)             |
