



PROCES VERBAL N° 1



PV

Date de la visite : Vendredi 10/09/2021

1

P1

Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS

IND.00

Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre
34250 PALAVAS-LES-FLOTS

Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE

Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots

Marché n° : 21POR06

Diffusion

Maîtrise d'Ouvrage :

MAIL

TELEPHONE

Représenté par,

Mr Gabaudan

dga@palavaslesflots.com

06 79 54 65 60

Mr Jeanjean

portdepalavas@palavaslesflots.com

06 09 08 29 89

Mme Olivier

audrey.olivier@palavaslesflots.com

06 43 49 95 04

Architecte :

Mr Cascales

cascales@architectes.org

06 09 71 23 25

Coordonnateur SPS :

JMATEC

jma@jmatec.fr

06 06 49 69 19

Coordinateur SSI :

A définir

Bureau de Contrôle :

Mr Dadone

clement.dadone@btp-consultants.fr

06 46 70 77 47

CONVOCATION

Présence

Diffusion

LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	Présence	CONVOCATION	Diffusion
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY	clermont@marcory.fr	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Pre	C	e-Mail
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	contact@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	C	e-Mail
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	contact@cma34.com laurent.ferrieres@cma34.com	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	C	e-Mail
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Pre	C	e-Mail
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	appelodoffres@sassodac.fr	04 67 03 38 38	Pre	C	e-Mail
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	c.energies34@gmail.com abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	Pre	C	e-Mail
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Pre	C	e-Mail
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	aopublics-cfa-sud@ascenseurnsa.fr Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 60 74 84 12	Exc	C	e-Mail
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	contact@cma34.com	04 67 78 17 80	Pre	C	e-Mail
10	SOLS / MUR & PEINTURE	En cours					
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Pre	C	e-Mail
12	PLATELAGE Ext.	En cours					
13	FACADE	En cours					

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé NC - Non convoqué C - Convoqué

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

CONVOCAATION N° 2

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 à 14:30

PROCES VERBAL N° 1

Bureau de contrôle : BTP Consultants

Mr Clément DADONE	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47
-------------------	--	----------------

Coordinateur SPS : JMATEC

Mr ANGILELLA	jma@jmatec.fr	06 06 49 69 19
--------------	--	----------------

PPSPS

En attente des documents des entreprises...

PASS SANITAIRE et réunion de chantier

A l'analyse, les réunions de chantier ne relèvent pas des activités pour lesquelles s'impose le passé sanitaire - et par suite nous ne sommes d'ailleurs pas autorisés à utiliser l'application "tousantiCovidverif".

A titre indicatif, on peut suggérer la pratique suivante pour l'organisation des réunions :

- (1) rappeler que personne ne doit participer à la réunion alors qu'il est positif et doit s'isoler,
- (2) maintenir les gestes barrières - salle préalablement ventilée puis ventilée toutes les heures, gel hydro-alcoolique à l'entrée et pendant la réunion pour les cas de manipulation d'objets, masque obligatoire et distanciation d'un mètre
- (3) sans ajouter un contrôle du passe.

GENERALITES

L'ensemble des pièces et démarches demandées, inscrit au Chapitre [2] du CCTP commun à tous les lots et notamment aux articles 2.2 & suivant, sont à fournir.

Nous rappelons que toutes des entreprises doivent prendre connaissance de l'ensemble des CCTP :

Concernant les études EXE et le calcul des descentes des charges, les conditions d'études sont inscrites au [chapitre 2] du CCPT CHARPENTE METALLIQUE / LOT 02

Charges d'exploitation limitées à 250 kg/m² conformément à l'engagement de la maîtrise d'ouvrage.

Caractéristiques des actions statiques à prendre en compte

Charges permanentes et poids propre déterminées automatiquement par le logiciel* Robot Structural Analysis.

Couvertures multicouche	30 daN/m ²	Lot 03
Faux plafond	15 daN/m ²	Lot 05
Bardage double peau + panneau HPL	35daN/m ²	Lot 03
Châssis vitré + support	50 daN/m ²	Lot 04
Structure porteuse et ensemble décoratif	50 daN/m ²	Lot 02
Divers	5 daN/m ²	à définir

A l'exception de l'entreprise EDISON (Lot 11), l'ensemble des lots précisera les charges statiques à prendre en considération pour le calcul de la structure métallique.

PLANNING TRAVAUX

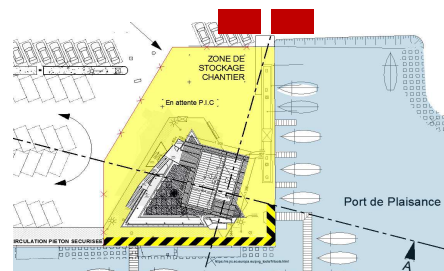
Sur la base du pré planning annexé au DCE, chaque entreprise fournira son planning d'intervention en vu d'une synthèse OPC

PLANS / Format numérique

L'ensemble des plans demandés au format DWG sont annexés au présent PV avec un accès permanent au téléchargement.

Le détail des Plans / Coupes & Modèle3D est listé en fin de document

A noter : L'entreprise CFA-NSA ascenseur doit communiquer son carnet de plans au format DWG

1	LE MARCORY	CONVOCATION : 21/09/2021	Oui
1,01	Pour mémoire :		
1,02	Les bureaux de l'accueil et de la capitainerie seront déménagés et positionnés au nord de la zone de chantier (en rouge sur le plan)		
1,03	Les toilettes existants (RDC Capitainerie) seront mis à disposition pour le personnel du chantier uniquement.		
1,04	La zone de circulation piétonne sécurisée (jaune & noir sur le plan) devra desservir l'accès aux quais principalement.		
1,05			
1,06			
1,07	PLANNING : Semaine N° 37/2021		
1,08	Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *		
2	CMA	CONVOCATION : 21/09/2021	Oui
2,01	PLATELAGE BOIS / Lot n°12		
2,02	Comme convenu, vous avez émis l'hypothèse de répondre aux prestations du lot n°12. Les CCTP / DPGF du lot concerné sont annexés ci-après.		
2,03	A noter : Un avenant au CCTP peut être apporté concernant la classe N°5 du bois de platelage. En effet, le perron de l'accueil est soumis épisodiquement à des submersions marine d'où la classification du bois. Néanmoins, il reste envisageable d'accepter un avenant au CCTP et une reclassification du bois en classe n°4 au dessus du niveau PHE (côte inscrite au PPRI) soit 2,40 m NGF		
2,04	BARDAGE / Lot n°03		
2,05	Pour répondre aux rallonges supposées des délais de fourniture des panneaux HPL (Trespa, Fundermax, ou autres), l'entreprise CMA Lot 03 pourra proposer, dans le cadres de son marché, une variante de bardage type alucobond avec une pose conforme à l'avis technique 2/16-1731. Un avenant au CCTP pourra être apporté le cas échéant.		
2,06	Charges admissibles des quais		
2,07	Nous ne sommes pas en mesure de fournir un détail précis pour la portance du sol, seule l'étude géotechnique, fournie au DCE, peut apporter des éléments de réponse.		
2,08	Dans le cadre de ses études l'entreprise adaptera sa méthode de mise œuvre soit par sondage géotechnique, soit par choix des caractéristiques du chariot élévateur ou en échafaudant ponctuellement.		
2,09	A noter : En présence des services techniques du port, un repérage des réseaux faiblement enterrés sera tracé au sol pour éviter les désordres.		
2,10	Relevés & maquette 3D :		
2,11	Pour mémoire les maquettes 3D de l'état des lieux (Formats rvt & ifc) et du projet (Format ifc) sont annexées au présent PV		
2,12	PLANNING : Semaine N° 37/2021		
2,13	Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *		
2,14	0		

11	EDISON	CONVOCATION : 21/09/2021	Oui
11,01	Structure porteuse des panneaux photovoltaïques :		
11,02	En complément du plan d'implantation & inclinaison des panneaux PV, l'entreprise EDISON doit se rapprocher de CMA pour évaluer l'impact sur les points singuliers de l'étanchéité (art.2.4.3.2 CCTP lot 03). En effet, la fixation mécanique de la structure PV (y compris l'étanchéité des goujons/plots) doit-être comparée avec le coût d'une structure de panneaux PV lestée.		
11,03			
11,04	PLANNING : Semaine N° 37/2021		
11,05			
11,06	Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *		0

A ► DOCUMENTS ANNEXES			
1	Lien de téléchargement permanent : CCTP Lot 12 / PLATELAGE EXTERIEUR BOIS		
2	CCTP Lot 12 / DPGF		
3	CCTP Lot 10 / REVÊTEMENT SOLS / MUR & PEINTURE		
4	CCTP Lot 10 / DPGF		
5	Lien de téléchargement permanent : PLANS / COUPES (pdf & dwg)		
6	http://files.ctpdce.com/04_Capitainerie PALALVAS PLANS prEXE/		
7	 12-1-20355m - PALAVAS -EDL coupes.pdf	.. Adobe Acrobat...	25/01/2021 12:29:40
	 210278 - PALAVAS LES FLOTS (indice 0) - ASCENCEUR -.pdf	.. Adobe Acrobat...	13/09/2021 10:53:03
	 00_1901-35 -- DET - 10 sept 2021- PALAVAS.dwg	.. Fichier DWG	13/09/2021 17:01:04
	 12-4-20355m - PALAVAS -EDL coupes.dwg	.. Fichier DWG	25/01/2021 12:29:40
	 14_1901-35_PALAVAS_Plan Masse_PRO.dwg	.. Fichier DWG	13/09/2021 15:11:03
	 15_1901-35_PALAVAS_Facades & Coupes_PRO.dwg	.. Fichier DWG	13/09/2021 15:07:06
	 16_1901-35_PALAVAS_Plan R+1_PRO.dwg	.. Fichier DWG	13/09/2021 15:54:27
8	 17_1901-35_PALAVAS_Plan R+2_PRO.dwg	.. Fichier DWG	13/09/2021 16:01:38
	 18_1901-35_PALAVAS_Plan RDC_PRO.dwg	.. Fichier DWG	13/09/2021 17:02:51
8	A noter : Les plans de l'ascenseur autoporté sont fournis au format pdf (Carnet N°210278).		
9	► DOCUMENTS / PIECES JOINTES		
10	 12-2-20355m - PALAVAS -EDL 3D maquette	Fichier IFC	1 018 Ko
	 12-3-20355m - PALAVAS -EDL 3D maquette.rvt	Fichier RVT	30 116 Ko
	 13_1901-35_PALAVAS-PRO _Modele-IFC-3D	Fichier IFC	3 046 Ko

Photos album WEB :

PHOTOS du : Vendredi 10/09/2021

<https://photos.app.goo.gl/aG71Aj6qYzc52GABA>



VISA :			
FICHE D'AGREMENT DE PRODUIT N°			
		Réception (date)	
		Avis architecte	
		Avis contrôle	
		Avis MO	
