


CTP Architectes 2021 Ordre des Architectes LR° S01312				PV					
COMPTE RENDU PV N° 6									
		Date de la visite :		Lundi 18/10/2021					
P1		Maître d'ouvrage :		PALAVAS-LES-FLOTS IND.00					
		Adresse :		16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS					
		Opération :		ELEVATION DE LA CAPITAINERIE					
		Adresse :		Port de plaisance de Palavas-les-Flots					
		Marché n° :		21POR06					
Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL	TELEPHONE						
Représenté par,	Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60	CONVOGATIC	Abs* n				
	Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89						
	Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04						
Architecte :	Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25						
Coordonnateur SPS :	JMATEC	jma@jmatec.fr	06 06 49 69 19						
Coordinateur SSI :	SO								
Bureau de Contrôle :	Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47						
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL			TELEPHONE	ETAT		
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN	clermont@marcory.fr			04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Pre	C	2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com			04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	C	
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	C			
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Abs	C	2		
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	Pre	C	1		
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	Pre	C			
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Pre	C			
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	Pre	C	4		
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	C			
10	SOLS / MUR & PEINTURE	En cours							
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Pre	C	3		
12	PLATELAGE Ext.	En cours							
13	FACADE	En cours							

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé NC - Non convoqué C - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * **Abs***
n

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

CONVOCAATION N° 7

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 25 OCTOBRE 2021 à 14:30

COMPTE RENDU PV N° 6

Semaine de préparation n°06 : du 18 au 22 octobre 2021 / Semaine n°42

01	<p>► PIC : RETARD : 3 semaines</p> <p>PIC ind A / En attente de validation - Faire apparaître les modules de l'accueil provisoire sur PIC (conflit d'emplacement)</p> <p>- Gestion de la distribution verticale chantier</p> <p>- Position du panneau de chantier</p> <p>Sous réserve de validation CSPS - L'accès au pontons E & F sera sécurisé par des clôtures ponctuelles sur les zones de travaux notamment autour de la démolition parvis accueil.</p>
02	
03	
04	
05	

06	► PLANNING : Rétro-planning ou délai d'intervention par tâche			
07	EN ATTENTE	Le MARCORY	Complément CMA Lot 3	GAYRAUD
08		EDISON	Etanchéité	CFA Ascenseur

09	► FONDACTIONS
10	VERSION DC4 Modifiée & Agrément d'autorisation de paiement AFR-MARCORY mis à la signature MOA
11	NOTE de CALCUL AFR (NDC1indB MIC21B14850) ► Le VISA "bon pour exécution" est en cours de préparation. L'entreprise AFR peut commander les tubes des micropieux

12	► IMPLANTATION
13	Le marquage des appuis tracés par CMA Charpente (semaine n°42) sera vérifié par l'implantation géomètre de l'entreprise Le Marcory et par respect du contradictoire.
14	<u>Pour ce faire, nous avons besoin :</u>
15	- Marquage contradictoire du géomètre expert
16	- Plan d'implantations des appuis de CMA Charpente au format Papier et format numérique IFC et/ou RVT suivant les demandes du géomètre.
17	- Faisabilité matérielle de l'encombrement de la foreuse - Type & dimension. (Marges de recul vis-à-vis des existants)

18	► DEVOIEMENT RESEAU Eaux Usées/Vannes
19	L'entreprise Le MARCORY doit donner les dates d'intervention pour le passage caméra afin de repérer le réseau entre le regard collecteur des sanitaires et le regard fil d'eau sur parking :
20	Informations attendues de l'inspection caméra :
21	- Marquage au sol du trajet du réseau enterré

22	- Longueur
23	- Profondeur
24	La livraison du rapport d'inspection caméra doit-être rendu au plus tôt et avant la fin du mois.

14	► DEMOLITIONS Entreprise : Le MARCORY
15	En attente des délais d'intervention et des modes opératoires par ZONE
16	<i>Pour mémoire, il y a 3 secteurs de préparation, avec : Zone I, Zone II & Zone III :</i>
17	<i>Définition des zones VOIR Art. 2 et suivant du CCTP LOT 01</i>

18	► CHARPENTE METALLIQUE / BARDAGES
19	Fournir les plans EXE aux formats papier et IFC
20	En attente de la mise à jour de l'assurance décennale
21	En attente du rétro-planning d'intervention étanchéité sur toit existant
22	Dans l'attente du visa de conformité architecturale, nous pouvons noter que les couleurs bardage seront :
23	RAL 9010 Blanc (Façades) & RAL 9007 Aluminium gris (Sous-face)


24	► ASCENSEUR CFA
25	Nous demandons à Mr CROS de CFA assesseur de communiquer une note sur les efforts de contacts du pylône sur la structure charpente.
26	<u>Contrôle des accès</u> : Le MOA doit définir si le protocole GSM sera privilégié vis-à-vis de la compatibilité LOGAPASS prévu au CCTP (Art.2.1.4 / CCTP Lot 08)
27	Dans l'attente du visa de conformité architecturale, nous pouvons noter que la couleur du pylône sera :
28	RAL 9007 Aluminium gris

29	► A L'ENSEMBLE DES LOTS TECHNIQUES (GAYRAUD & CAMBORDE)
30	Sur PIC, faire un descriptif opérationnelle des branchements EAU et coffret élec., avec :
31	- Section des réseaux de distribution
32	- Caractéristiques techniques
33	GAYRAUD : ► En attente du plan de raccordement TGBT, Divisionnaire 2, autres
34	Sur demande MOA à clarifier et en l'absence d'une colonne montante, comment envisager la possibilité de branchements (à définir) ultérieurs aux travaux.
35	CAMBORDE : ► Matérialiser sur site la VMC R+1 avec branchement du moteur sur le soffite (poteau/meneau) ou variante sortie en toit terrasse.
36	Viser la proposition de France Aluminium (voir coupe en annexe) des grilles d'entrée d'air au R+2)

37	► LOT MENUISERIE
38	Une étude de coordination technique entre les lots Charpente-Bardage & Plâtrerie + CVC est à prévoir.
39	Dans l'attente du VISA de conformité architecturale, les entreprises CMA et SODAC doivent donner un avis sur les plan coupe de France Aluminium (Voir en annexe)
40	A NOTER : Les poteaux de la structure façade sont prévus en tube de 140 mm

A	► DOCUMENTS ANNEXES		
	PLAN / COUPE de France Alu (x3 documents)		
	https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fq9zcsC9		PHOTOS du :
	VISA :		
		FICHE D'AGREMENT DE PRODUIT N°	
		Réception (date)	
		Avis architecte	
		Avis contrôle	
		Avis MO	

PROJET DE POSE MENUISERIES EXTERIEURES SUR STRUCTURES CHARPENTE

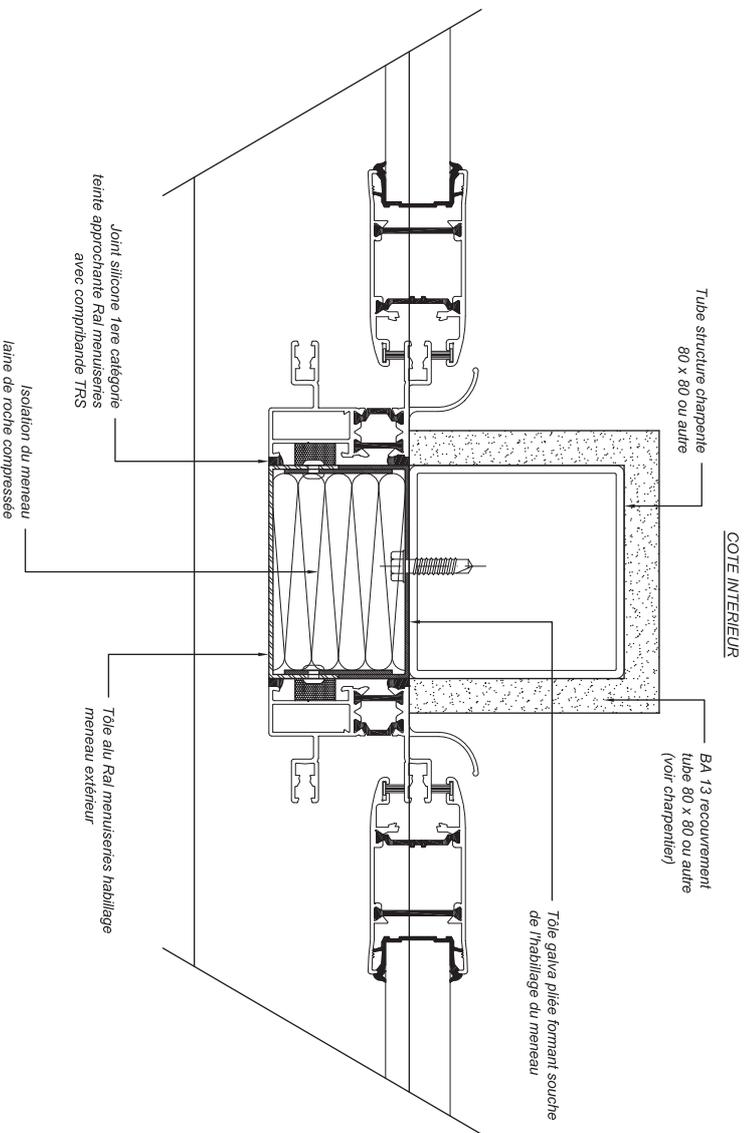


Plan N° 34 / 10	Date : 14 - 10 - 21	Modifié le :	Indice Etude	Echelle : 1/2
Dessiné par : Mounition C	Chantier :		CAPITAINE - PALAVAS	

FRANCE ALUMINIUM

760, Route d'Avignon
84 450 - Saint Saturnin les Avignon
Tel : 04-90-22-19-88
e.mail : france.aluminium@wanadoo.fr

COUPE HORIZONTALE


PROJET DE POSE MENUISERIES EXTERIEURES SUR STRUCTURES CHARPENTE

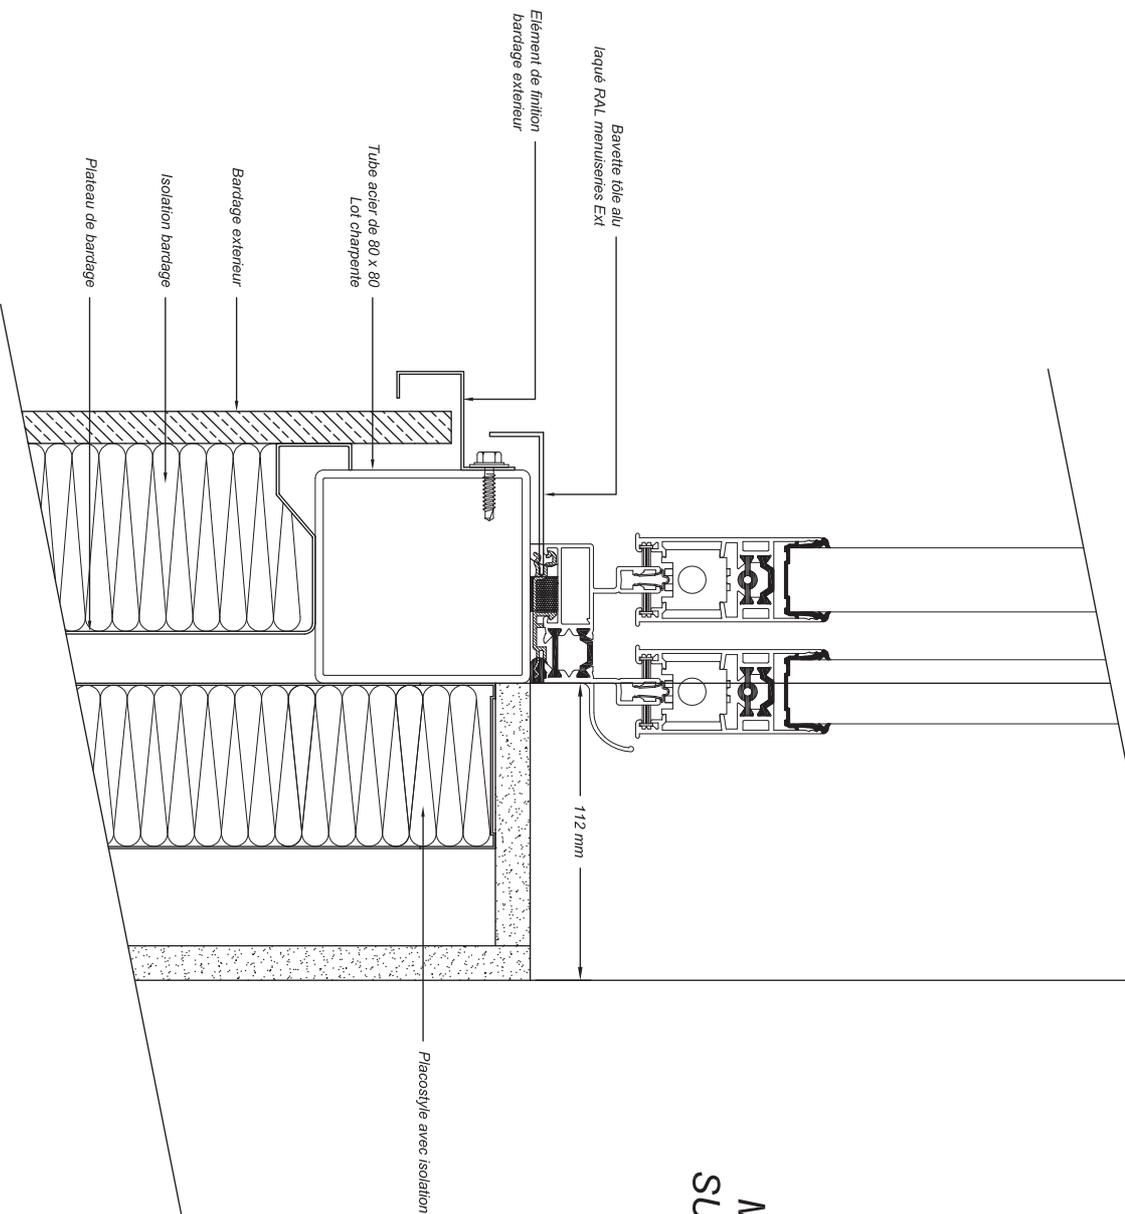

Plan N° 34 / 09	Date : 14 - 10 - 21	Modifié le :	Indice Etude	Echelle : 1/2
Dessiné par : Mounition C	Chantier :		CAPITAINE - PALAVAS	

FRANCE ALUMINIUM
760, Route d'Avignon
84 450 - Saint Saturnin les Avignon
Tel : 04-90-22-19-88
e.mail : france.aluminium@wanadoo.fr

COUPE VERTICALE

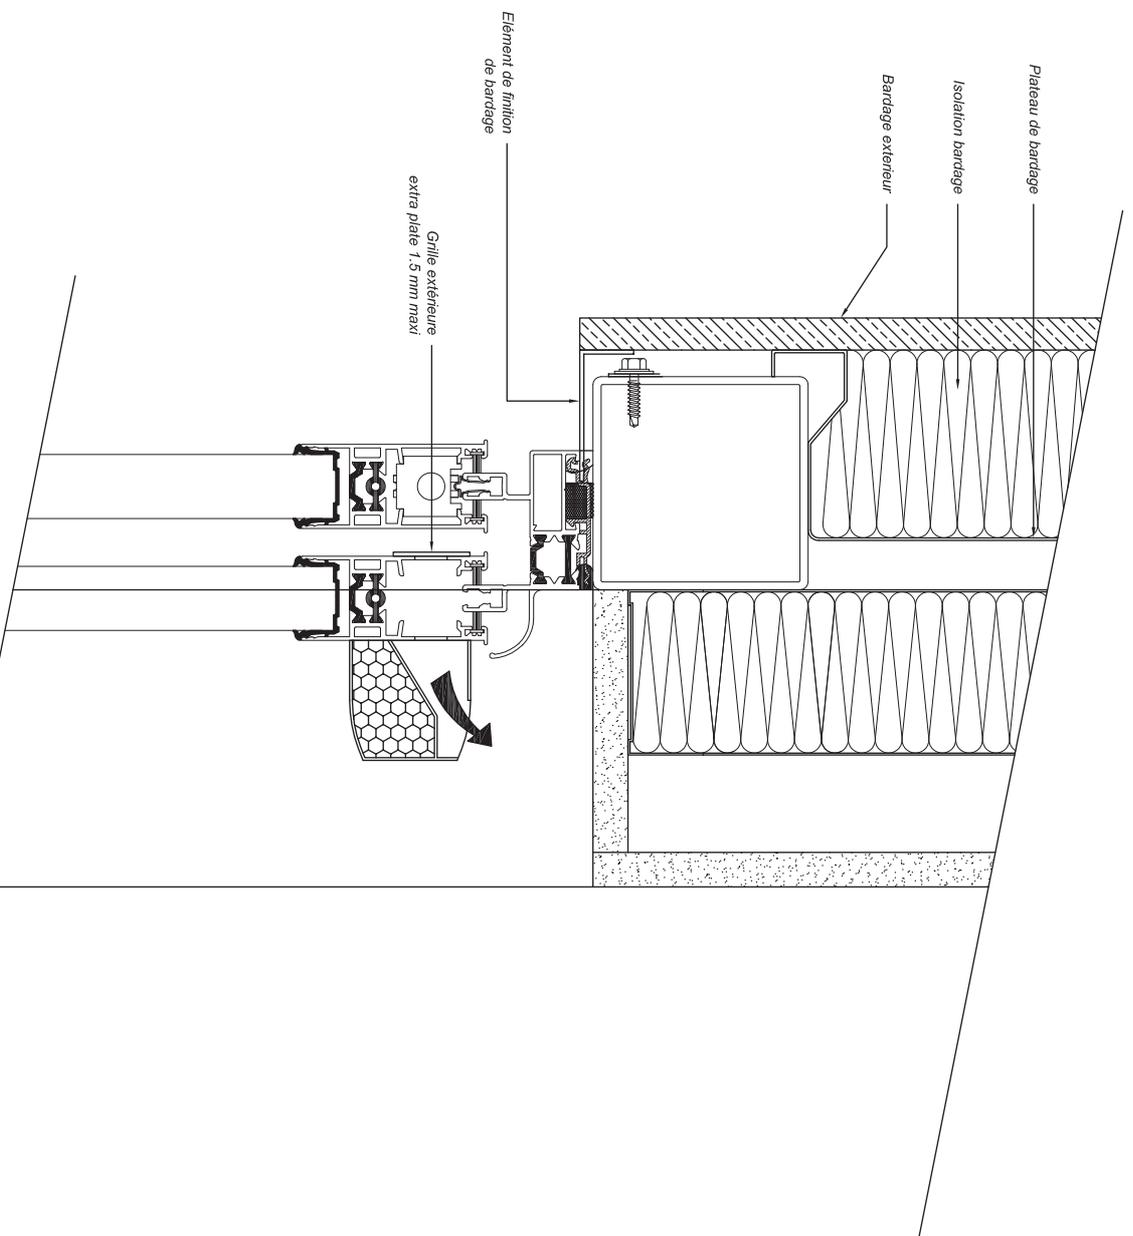

Plan N° 34 / 09 | Date : 14 - 10 - 21 | Modifié le : | Indice Etude | Echelle : 1/2
 Dessiné par : Mounition C | Chantier : CAPITAINE - PALAVAS

FRANCE ALUMINIUM
 760, Route d'Avignon
 84 450 - Saint Saturnin les Avignon
 Tel : 04-90-22-19-88
 e.mail : france.aluminium@wanadoo.fr

Positionnement bouche entrée d'air
