


CTP Architectes 2021 Ordre des Architectes LR° S01312				PV					
COMPTE RENDU PV N° 7									
Date de la visite :			Lundi 25/10/2021		7				
P1	Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS				IND.00				
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS									
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots Marché n° : 21POR06									
Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL	TELEPHONE						
Représenté par,	Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60	CONVOGATIC	Abs* n				
	Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89						
	Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04						
Architecte :	Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25						
Coordonnateur SPS :	JMATEC	jma@jmatec.fr	06 06 49 69 19						
Coordinateur SSI :	SO								
Bureau de Contrôle :	Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47						
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL			TELEPHONE	ETAT		
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN	clermont@marcory.fr			04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Pre	C	2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com			04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	C	
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	C			
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Pre	C	2		
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	Exc	C	1		
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	Pre	C			
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Pre	C			
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	Abs	C	5		
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	C			
10	SOLS / MUR & PEINTURE	En cours							
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Abs	C	4		
12	PLATELAGE Ext.	En cours							
13	FACADE	En cours							

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé NC - Non convoqué C - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

Abs*
n

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

CONVOCAATION N° 8

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

MARDI 02 NOVEMBRE 2021 à 14:30

COMPTE RENDU PV N° 7

Semaine de préparation n°07 : du 25 au 29 octobre 2021 / Semaine n°43

01	► Demande au MOA :
02	L'entreprise Camborde est en attente du diagnostique technique des climatiseurs du R+1 pour réparation ou remplacement à définir.
03	Le MOA doit définir si le protocole GSM sera privilégié vis-à-vis de la compatibilité LOGAPASS prévu au CCTP (Art.2.1.4 / CCTP Lot 08)

04	► PIC : PIC ind C / En attente avec : - Faire apparaître les modules de l'accueil provisoire sur PIC (conflit de limite) - Gestion de la distribution verticale chantier - Position du panneau de chantier - Avancer l'aire de livraison devant les bennes, suivant les recommandation du CSPS
05	
06	
07	
08	

09	► PLANNING : Rétro-planning ou délai d'intervention par tâche		
10	EN ATTENTE	Complément CMA Lot 3	<i>GAYRAUD</i>
11	EDISON	Etanchéité	CFA Ascenseur

12	► DEVOIEMENT RESEAU Eaux Usées/Vannes
13	L'inspection camera du réseau d'assainissement, mise en œuvre par l'entreprise Le MACORY, permet de tracer sur le trottoir le réseau enterré et met en évidence des conflits d'implantation des fondations. A Noter: Les difficultés de dévoiement du réseaux d'assainissement, prévu au CCTP art.2.3.1.2 Lot 01, doivent- être argumentées par l'entreprise Le Marcory à l'écrit et à l'attention du maître de l'ouvrage.

14	► IMPLANTATION
15	En compléments des observations sur le précédent PV6, nous demandons :
16	CMA > de poursuivre le tracé des appuis manquants (à savoir : N°4, 13, 14, 17,18)
17	CMA > Revoir le positionnement des appuis n°3, 2, 10 et 12 avec le niveau +0.00 de référence défini, A SAVOIR : Le niveau actuel devant la porte d'entrée de l'accueil est égal : + 0.27 m/ +0.00 , soit un delta de 1 m avec la côte NGF
18	Le MARCORY > En attente du marquage contradictoire

19	► FONDATIONS
20	Au regard des charges du palier ascenseur du R+1 (EFS/CMA), l'entreprise AFR/MARCORY doit étudier la variante d'une simple longrine de fondation pour les appuis CMA n°10 et n°11. A Noter : l'impossibilité technique actuelle de forer les micropieux
21	Le MARCORY > En attente du dimensionnement des tête de pieux pour VISA

22	► ASCENSEUR CFA
23	En complément du chiffrage du kit GSM, le MOA doit prendre en charge la CARTE SIM / MtoM (Machine to Machine) chez Orange.
24	EN ATTENTE Délais d'intervention et des prés requis de réception (Radier, palier, branchement en attente, etc.)
28	Couleur du pylône : RAL 9007 Aluminium gris
29	► ENCAPSULAGE R+1 En attente de l'offre de l'entreprise Le MACORY pour : Mise en œuvre d'une chape sur Isolant après ravoilage des réseaux.

30	► ETAT D'AVANCEMENT DES DOSSIERS EXE et autres documents
31	► LOT 01 : En attente des modes opératoires des démolitions au R+1 pour validation SPS
32	► LOT 02 : En cours... Prise en compte des premiers VISA de conformité VL01-01 & VL02-01 (Altimétrie têtes de pieux & NDC Structure)
33	► LOT 03 : En attente de la décennale à jour + retro planning & mode opératoire.
34	► LOT 04 : En attente des fiches produits au format papier - Plan fourni en cours de validation
35	► LOT 05 : Documents techniques fournis. VISA (MOE SPS, CT & CSPS) et agrément MOA en cours de préparation.
36	► LOT 06 : Documents techniques fournis et en cours d'élaboration concernant clim et VMC R+1. VISA (MOE SPS, CT & CSPS) et agrément MOA en cours de préparation.
37	► LOT 07 : En attente du dossier technique des fiches produits (pdf & format papier)
38	► LOT 08 : Documents techniques fournis. VISA (MOE SPS, CT & CSPS) et agrément MOA en cours de préparation.
39	► LOT 09 : En attente du dossier technique des fiches produits (pdf & format papier)
40	► LOT 10 : .../...
41	► LOT 11 : En attente du dossier technique des fiches produits (pdf & format papier)
42	► LOT 12 : .../... en attente de l'offre CMA concernant le platelage


A	► DOCUMENTS ANNEXES
	PLAN / COUPE de France Alu (x3 documents)

<https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fg9zcsC9>

PHOTOS du :

▼ 01- Vue du tracé réseau d'assainissement

Vue du marquage de l'appuis n°2 /▼

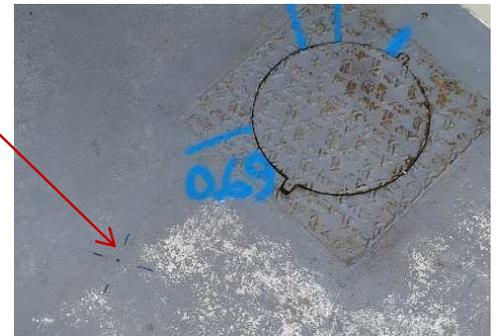

	VISA :		
		FICHE D'AGREMENT DE PRODUIT N°	
		Réception (date)	
		Avis architecte	
		Avis contrôle	
		Avis MO	
