


CTP Architectes 2021 Ordre des Architectes LR° S01312				PV		
COMPTE RENDU PV N° 21						
Date de la visite :			Lundi 07/02/2022	21		
P1	Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS			IND.00		
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS						
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots Marché n° : 21POR06						
Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL	TELEPHONE			
Représenté par,	Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60	22		
	Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89		pré	
	Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04		pré	
Architecte :	Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25	CONVOCACTION		
	Coordonnateur SPS : Mr Angilella	jma@jmatec.fr	06 06 49 69 19		abs	
Coordinateur SSI :	SO					
Bureau de Contrôle :	Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47	abs		
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT	Abs* n
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS & LARIBAN	clermont@marcory.fr Mlle Adeline BROUSSE	04 67 96 79 30 06 76 48 68 84	Pre	C 2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	C
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr 07 64 44 99 69	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	C
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	NC	NC 3
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	NC	NC 2
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	NC	C
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	NC	C
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	Abs	C 6
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	C
10	SOLS / MUR & PEINTURE	Le Marcory. Ent. Violan	contact@violan-peinture.fr			C
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Abs	C 9
12	PLATELAGE Ext.	En cours	mhaurat@amexbois.fr	06 68 28 20 07		NC
13	FACADE	En cours				

Pre - Convoqué/Présent **Abs** - Convoqué/Absent **Exc** - Convoqué/ Excusé **NC** - Non convoqué **C** - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

**Abs*
n**

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

CONVOCACTION N° 22

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 14 FEVRIER 2022 à 14:30

COMPTE RENDU PV N° 21

TRAVAUX Semaine n°12 :

du 31/01 au 04 février 2022 / Semaine n°05-2022

01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	3480
02	► MOA :		
03	> DET/OPC : Mise à jour PLAN R+2 / cf. annexe A1		
04	> DET : Modification du CCTP Lot 12 pour relecture avant communication		
05	Prévoir structure primaire pour panneaux photovoltaïques [HEB / dé béton]		
06	► CT / BTP Consultant :		
07	> Avis suspendu sur FDV n°5		
08	> Avis suspendu sur FED n°15		
09	Demande d'avis sur PLAN R+2 modifié + GT (Cf. plan n° 52 ind C en annexe)		
10	► CSPS		
11			

12	► LOT 01 :	Le MARCORY / AFR / CSBTP
13	RESERVES avant coulage du béton de la longrine LG2	
14	> Avis suspendu du CT, pour absence d'étude BE à jour pour le ferrailage de la longrine.	
15	► Cf. LOT 10	
16	La solution d'une chape ciment traditionnelle sur l'ISO-chape projetée doit-être envisagée	
17	► LOT 02 :	CMA
18	Démarrage & montage de charpente à partir du 10/02/2022	
19	Obtention de l'arrêté de voirie n°n°22 /2022V – Capitainerie (Port de Plaisance).	
20	PAPPEL :	
21	La découpe du haut de l'acrotère béton s'effectuera à l'aplomb de la fosse ascenseur :	
22	Dimension à respecter 1400 x 1650 mm / Position : dans l'axe des appuis CMA n°5 & n°7	

23	► LOT 03 :	CMA / GECAPE-SUD	
24	ETANCHEITE : En attente des fiches produits et points singuliers à définir pour VISA		
25	Entrée d'eau en attente - NON CONFORME -		
26	Les entrées d'eau pour l'évacuation des eaux de pluie doivent impérativement avoir une section intérieure de Ø110 mm MINIMUM		
27	<u>BESOIN EEP :</u> 11.5 litres/sec		
28	En attente du devis d'étanchéité pour terrasse R+1		
29	► LOT 04 :	FRANCE ALUMINIUM	
30	A l'exception du plafond SAS : Carnet technique conforme		
31	► LOT 05 :	SODAC	
32	VISA à venir		
33	► LOT 06 :	CAMBORDE	
34	Prévoir intervention suivant le rétro-planning - ind 04* (Cf. PV20)		
35	► LOT 07 :	GAYRAUD	
36	Prévoir intervention suivant le rétro-planning - ind 04* (Cf. PV20)		
37	► LOT 08 :	CFA Division NSA	
38	Prévoir intervention suivant le rétro-planning - ind 04* (Cf. PV20)		
39	► LOT 10 :	MARCORY / VIOLAN	
40	► R+1		
41	L'entreprise VIOLAN doit se rapprocher de MARCORY, attributaire du marché de travaux, pour présenter une solution commune et concertée à la maîtrise d'ouvrage.		
42	Proposer une solution qui répond aux contraintes d'humidité au R+1.		
43	Prévoir chape ciment traditionnelle (ép.. 6 cm) sur l'ISO-chape projetée.		
44	► LOT 11 :	EDISON	
45	IMPLANTATION PV NON CONFORME		
46			

A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	Plan n°50 Ind B [R+2]
A2	
A3	


LIEN <https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjflFq9zcsC9>

PHOTOS du : Lundi 07/02/2022

▼ 01



▲ 02

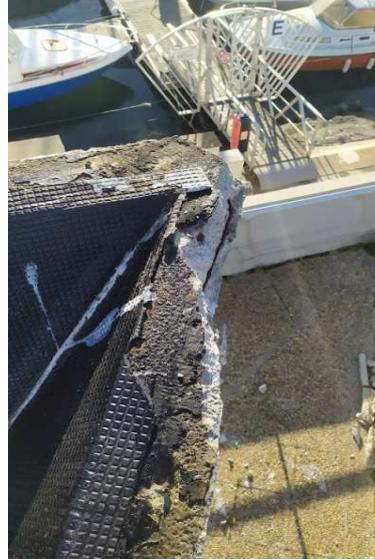

▲ 03



▲ 04

- | | |
|----|---|
| 01 | ▶ Avis suspendu sur reprise ferrailage (longrine sous escalier) |
| 02 | ▶ Primaire bitumé & pare-vapeur type Elastovap* à confirmer |
| 03 | ▶ Eclatement béton sur arase d'acrotère (côté Sud-est) |
| 04 | ▶ Entrée d'eau pour évacuation EP Ø 100 mm - NON CONFORME |
