


CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312				<b>PV</b>			
COMPTE RENDU N° 32							
<b>Date de la visite :</b>			Mardi 25/04/2022	<b>32</b>			
<b>P1</b>	<b>Maître d'ouvrage :</b> PALAVAS-LES-FLOTS			00			
<b>Adresse :</b> 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS							
<b>Opération :</b> ELEVATION DE LA CAPITAINERIE <b>Adresse :</b> Port de plaisance de Palavas-les-Flots <b>Marché n° :</b> 21POR06							
Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL	TELEPHONE				
Représenté par,	Mr Gabaudan	<a href="mailto:dga@palavaslesflots.com">dga@palavaslesflots.com</a>	06 79 54 65 60	<b>CONVOCACTION n° 33</b>			
	Mr Jeanjean	<a href="mailto:portdepalavas@palavaslesflots.com">portdepalavas@palavaslesflots.com</a>	06 09 08 29 89				
	Mme Olivier	<a href="mailto:audrey.olivier@palavaslesflots.com">audrey.olivier@palavaslesflots.com</a>	06 43 49 95 04				
<b>Architecte :</b>	Mr Cascales	<a href="mailto:cascales@architectes.org">cascales@architectes.org</a>	06 09 71 23 25	<b>Abs* n</b>			
<b>Coordonnateur SPS :</b>	Mr Angilella	<a href="mailto:jma@imatec.fr">jma@imatec.fr</a>	06 06 49 69 19				
<b>Coordinateur SSI :</b>	SO						
<b>Bureau de Contrôle :</b>	Mr Dadone	<a href="mailto:clement.dadone@btp-consultants.fr">clement.dadone@btp-consultants.fr</a>	06 46 70 77 47				
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT		
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS Clément	<a href="mailto:clermont@marcory.fr">clermont@marcory.fr</a> ----->	04 67 96 79 30 06 74 98 98 29	Exc	1	2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	<a href="mailto:bertrand.marolleau@cma34.com">bertrand.marolleau@cma34.com</a>	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	1	
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	<a href="mailto:jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr">jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr</a> 07 64 44 99 69	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	1	
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	<a href="mailto:france.aluminium@wanadoo.fr">france.aluminium@wanadoo.fr</a>	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Pre	1	4
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	<a href="mailto:contact@sassodac.fr">contact@sassodac.fr</a> <a href="mailto:a.jansen@sassodac.fr">a.jansen@sassodac.fr</a>	04 67 03 38 38 06 76 05 26 12	0	1	3
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	<a href="mailto:abosc.ce34@gmail.com">abosc.ce34@gmail.com</a>	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	0	1	
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	<a href="mailto:contact@gayraud-elec.fr">contact@gayraud-elec.fr</a>	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	0	1	
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	<a href="mailto:Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr">Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr</a>	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	Abs	1	10
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	<a href="mailto:bertrand.marolleau@cma34.com">bertrand.marolleau@cma34.com</a>		Pre	1	
10	SOLS / MUR & PEINTURE	Le Marcory. Ent. Violan	<a href="mailto:contact@violan-peinture.fr">contact@violan-peinture.fr</a>		Exc	1	
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	<a href="mailto:m.hasni@edison-energies.com">m.hasni@edison-energies.com</a>	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Abs	1	17
12	PLATELAGE Ext.	En cours	<a href="mailto:mhaurat@amexbois.fr">mhaurat@amexbois.fr</a>	06 68 28 20 07	0	0	
13	FACADE	En cours					

**Pre** - Convoqué/Présent   **Abs** - Convoqué/Absent   **Exc** - Convoqué/Excusé   **[0]** - Non convoqué   **[1]** - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier \*

**Abs\***

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera

## CONVOCACTION N° 33

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
<b>LUNDI 02 Mai 2022 à 14:30</b>

COMPTE RENDU N° 32

TRAVAUX Semaine n°23 :	du 18 au 22 avril 2022 / Semaine n°16-2022
------------------------	--

01	<b>► INSTALLATION CHANTIER :</b>	<b>CODE ACCES :</b>	3480
----	----------------------------------	---------------------	------

<b>2</b>	<b>MOA :</b>	<i>Pour mémoire : Diagnostic façade prévue le 03/05/22</i>
3	Signatures MOA en attente, avec :	
4	Analyse de l'offre MARCORY concernant + et - values avec marché séparé ou pas (PIC.02)	
5		
6	Agrément en attente : [FAP02-01b] > Cofradal*	
7	Agrément en attente : [FAP03-01] > Ligne de vie	
8	Agrément en attente : [FAP05-01] > Dossier technique plâtrerie & aménagement	
9	Agrément en attente : [FAP06-01] > Plan de travail stratifié	
<b>10</b>	<b>► CT / BTP Consultant :</b>	
11	► DEMANDE de l'avis technique sur études EXE du BET aceb pour reconstruction escalier	
12	> Avis suspendu : Dossier technique étanchéité sur BAC / FDV n°10	
13	> RAPPEL des avis suspendus en attente de réponse entreprises CMA & EDISON, avec : FDV n°6 + FDV n°8 + FED n°15	
<b>13</b>	<b>► CSPS</b> / Cf. Registre de Journal n°26	
14	RAS	

<b>15</b>	<b>► LOT 01 : Le MARCORY / SOREDAL : 06 75 08 44 96</b>	Convocation n° 33	<b>OUI</b>
16	<b>ACROTÈRES &amp; Autres reprises béton</b>		
17	► En ATTENTE des travaux de parachèvement par l'extérieur, avec Weber REP :		
18	<b>ESCALIER Béton</b>		
19	En attente des études béton (aceb) pour validation CT et planification de l'intervention		
20	► Ferrailage du palier béton absent		
21	<b>Travaux VRD</b>		
22	► Conformément aux plans d'aménagement RDC, au tracé de l'escalier CMA et au compte rendu précédent, l'entreprise doit marquer l'implantation des bordures T1 sur site pour validation MOE		
23	► Evacuation EP fosse ascenseur		

24	<b>INSTALLATION CHANTIER</b> / Eté 2022	
25	▶ En attente signature MOA et conformément aux demandes du dernier compte-rendu.	
26	<b>RECEPTION TRAVAUX prévu le 15 mai 2022</b>	
27	▶ ▶ ▶ ▶ ▶ Sous réserve d'une approbation MOA, nous demandons une intervention expresse pour fin de <b>semaine n°17/2022</b>	
28	<b>GT SANITAIRES RDC</b> (Rappel hors marché)	
29	▶ Programmation pour la mise en œuvre de la réparation DEP y compris placo & faïence	
30	▶ <b>LOT 02 : CMA</b>	Convocation n° 33 <b>OUI</b>
31	<b>ESCALIER RDC</b> ▶ Tracer sur site le départ de l'escalier (Cf. PV n°27)      ▶ <b>URGENT</b> ◀	
32	<b>PROTECTION</b> ▶ Protéger tous les poteaux thermo laqués ( h.2 m)	
33	▶ <b>APPUI BAIE COULISSANTE</b> sur terrasse : Mettre en place un appui de baie (bureau n°6) pour que France-Alu assure l'étanchéité <b>En attente de la POSE du TUBE</b> (vu sur site)	
34	<b>R+2</b> ▶ Mise en place les lames pare-soleil avec éclisse	
35	<b>R+2</b> ▶ Finaliser la jonction poteau/structure pare-soleil (côté ascenseur)	
36	▶ <b>LOT 03 : CMA / ASTEN</b>	Convocation n° 33 <b>OUI</b>
37	<b>ETANCHEITE</b> ( Support bac acier) <span style="float: right;"><i>Référent ASTEN (Mr Rouina : 06 11 30 33 68)</i></span>	
38	▶ En attente de la mise en eau de l'étanchéité <b>URGENT</b> ▶ Fournir Dossier EXE et fiches produits étanchéité ASTEN (RAPPEL CT)	
39	<b>Trémies plancher bas R+2</b>	
40	▶ Carottages avec tracés en attente pour validation MOA / MOE et lots techniques	
41	<b>BARDAGE TREPA</b>	
42	▶ En attente des finitions structurelles avec ossatures en extrémité des allèges-tripode.	
43	▶ Les différents détails de calepinage seront traités sur site avec Mr BARDY	
44	Mr BANTON doit fournir les plans de la sous face du tripode avec la projection des différentes sous-face des allèges-tripode (Cf. annexe A2)	
45	▶ <b>LOT 04 : FRANCE ALUMINIUM</b>	Convocation n° 33 <b>OUI</b>
46	▶ INTERVENTION : Pose et réglages des menuiseries à partir du lundi 25/04 - <b>SEMAINE n°17/2022</b> -	
47	▶ En attente de la pose des vitrages pour assurer le hors d'air <u>AVANT le 06 MAI</u>	
48	Nous demandons de poser des affiches de prévention ( <b>protection vitrage</b> ) postées en annexe A1	
47	Fournir le détail technique du plafond SAS (Eclairage encastré en attente de décision MOA)	


48	► <b>LOT 05 : SODAC</b>	Convocation n° 33	<b>OUI</b>
49	<b>INTERVENTION</b> prévue pour la première semaine de mai - <b>SEMAINE n°18/2022</b> -		
50	► En attente des détails d'aménagement Yacht-club		
51	L'entreprise doit fournir un descriptif technique de l'aménagement du coin préparation avec :		
52	> Nuancier pour portes coulissantes (SOGAL ECO+)		
53	> Nuancier pour panneaux mélaminés (plan de travail préparation)		
54	> Echantillon de la tablette hêtre (comptoir)		
55	► En attente des détails d'aménagement R+2		
56	> Poignées de porte prévues (ouvrant et coulissant)		
51			
52	► <b>LOT 06 : CAMBORDE</b>	Convocation n° 33	<b>OUI</b>
53	L'entreprise doit à intervenir <u>en concertation</u> avec l'avancée travaux de la plâtrerie [R+1 & R+2]		
54	<b>INTERVENTION</b> prévue pour la première semaine de mai - <b>SEMAINE n°18/2022</b> -		
55	Réfèrent Chantier pour SODAC : a.jansen@sassodac.fr 06 76 05 26 12		
56	<b>CLIMATISEURS :</b> ▼ <b>RAPPEL</b> ▲		
57	Prévoir l'installation des groupes extérieures suivant l'implantation visée sur plan n°58		
58	► <b>LOT 07 : GAYRAUD</b>	Convocation n° 33	<b>OUI</b>
59	► <b>IDEM LOT 06 // INTERVENTION</b> prévue - <b>SEMAINE n°18/2022</b> -		
60	Une variante de produit pour l'éclairage extérieur du Yacht-club est demandé pour avis MOE & MOA (type linéaire led ou similaire) ◀ <b>RAPPEL</b> ▼		
61	Demande de chiffrage pour l'éclairage encastré extérieur avec détecteur (Localisation : SAS R+2)		
62	► <b>LOT 08 : CFA Division NSA</b>	Convocation n° 33	<b>OUI</b>
63	En attente de la réception des travaux pour la pose de l'ascenseur.		
64	► Date prévue en JUIN 2022 (à déterminer)		
65	<b>PROTECTIONS ASCENSEUR</b>		
66	La protection mise en place par CFA est <b>incomplète et insuffisante</b>		
67	L'entreprise CFA engage son entière RESPONSABILITE quant au dommages du pylône avant la réception de juin. Nous demandons à l'entreprise de prendre expressément contact avec MOE et /ou MOA. Cf. images ci-après		
68	► <b>LOT 10 : MARCORY / VIOLAN</b>	Convocation n° 33	<b>OUI</b>
69	<b>R+1 &gt; Chape liquide / isochape</b>		
70	Pour corriger les défauts de la chape liquide (Cf. PV n°30), l'entreprise Euro-chape doit prévoir un ragréage après le redimensionnement de la trémie. - <b>URGENT</b> - <u>Rappel</u> <b>Prévoir intervention fin de SEMAINE n°17/2022</b>		

71	<b>R+1 &gt; Réfection plafond</b>		
72	▶ INTERVENTION : - <b>SEMAINE n°17/2022 - URGENT</b> -		
73	▶ Réfection des poteaux béton du niveau Yacht-club : ... en attente de signature MOA du Chiffrage n°22005A Marcory:		
74	▶ <b>LOT 11 : EDISON</b>	Convocation n° 33	<b>OUI</b>
75	<b>ETUDES EXE NON FORUNIES</b>		
76	> Avis suspendu sur le dispositif de coupure d'urgence AC photovoltaïque / FED n°15		

<b>A</b>	▶ <b>DOCUMENTS ANNEXES</b>		
<b>A1</b>	Affiche de prévention (protection vitrage)		
<b>A2</b>	Plan n°66_21POR06_PALAVAS_DETAILS TRESPA		

<b>LIEN</b>	<a href="https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fq9zcsC9">https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fq9zcsC9</a>
-------------	---

PHOTOS du : Mardi 25/04/2022

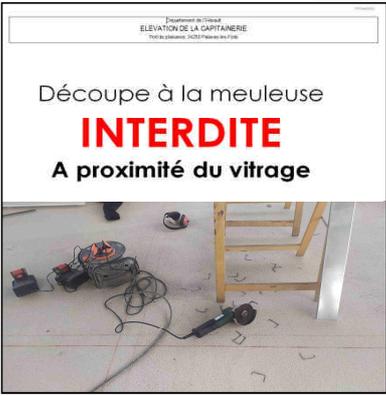▼ 01	▼ 02
	
▲ 01	▲ 03
	

01	▶ PROTECTION Ascenseur incomplète
02	▶ PROTECTION Ascenseur <b>insuffisante</b>
03	▶ AFFICHAGE OBLIGATOIRE ( Cf. annexe)
04	▶ POSE des cadres de menuiseries sur tôles d'appui (larmier)
05	▶

06



▼ 04

