


CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312							
COMPTRE RENDU N° 02						PV	
		Date de la visite :		Lundi 27/02/2023		02	
P1	Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS					00	
		Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre			34250 PALAVAS-LES-FLOTS		
Opération : REHABILITATION DE LA CAPITAINERIE					IND 02 / INFO TRESPA		
Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots							
Marché n° : 23POR01							
Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL		TELEPHONE		* Diffusion	
Représenté par,	Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60		x		CONVOCA TION n° 3
AMO :	Mr Gallego	c-energia@orange.fr	06 11 02 37 79		x		
Service Marché :	Mme Reynes	marches.publics@palavaslesflots.com			x		
MOE VRD [n° 22POR35]	Mme Tourvieille	z.tourvieille@seiri.fr			x		Abs* nbr
Architecte :	Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25				
BET Fluides :	Mr Combres	arnaud.combres@gmail.com	7 09 71 23 25		x		
Coordonnateur SPS :	Mr MALSERT	benoit.malsert@socotec.fr			x		
Bureau de Contrôle :	Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47		x		
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT		
1	GROS ŒUVRE/FONDATION	Le MARCORY	clermont@marcory.fr	04 67 96 79 30	Pre	1	
	Mr DELPAPA Régis	Lionel ROUGE	l.rouge@marcory.fr	06 74 98 98 42			
	Façade	SOLARES					
	Etanchéité	SEM étanchéité					
	Platelage	TBM	sophie.simon@tbm-constructions.fr	06 72 45 13 41			
2	MENUISERIES ALU.	FRANCE	france.aluminium@wanadoo.fr		Pre	1	
	Mr MOUNITION Christian	ALUMINIUM		06 12 34 06 91	x		
	Mr MOUNITION Patrick			06 03 62 7555			
3	Plâtrerie		a.grenes@meditrag.fr	06 66 96 64 53	Pre	1	
	Revêtement Sol	MEDITRAG					
	Peintures						
4	PLOMBERIE & CVC	CAMBORDE	abosc.ce34@gmail.com	06 81 98 95 52	Pre	1	
	Mr BOSCH Anthony	Energie 34					
	ELECTRICITE & SSI	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	06 12 35 63 04	x		

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé [0] - Non convoqué [1] - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * **Abs**

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation

CONVOCAION N° 3

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 06 MARS - 10:00 heures

COMPTRE RENDU N° 02


PREPARATION Semaine n°02 : ... du 13/02 au 24/02/2022 ► Semaine n°8-2023

01 ► INSTALLATION CHANTIER :

CODE ACCES :

2	► MOA & AMO :	
3	• Demande MOE / du récépissé de dépôt DDP pour suivi : Dossier DP + Notices (HAND & SI) posté par courriel le 23/02/2023 / To : DGA - AMO - CT- MP	
4	• Demande MOE / pour validation du panneau de chantier & fabrication à charge lot 01 Maquette pdf postée par courriel le 22/02/2023 / To : DGA - AMO - CT- MP	
5	• DEMANDE AVENANT pour reconditionnement des liaisons frigo. Niveau Yacht-club / Lot 4	
6	► CT / BTP Consultant :	INFO pour BET SEIRI ◀◀◀
7	• RAMPE PMR ACCUEIL ► Pour avis et sous réserve que la rampe s'arrête avant le débattement de la porte de l'accueil, il n'y a réglementairement pas de conflit d'accessibilité. • Le palier devant la porte de l'accueil doit avoir une dimension minimum de 1,20 x 2,20 m	
8	Excusé pour l'absence à la réunion du 27/02, Mr Dadone sera présent le 06/03/2023	
9	► CSPS	
10	Ensemble des compte-rendus VIC et PPSP transmis par mail le 15/02	
11		
12	► INFO pour BET SEIRI ◀◀◀	
13	• Demande d'un tranchée pour pose de 3 PVC Ø 100 mm (Liaisons Frigo PAC) y compris passage sous bordure de vigilance en sous-face escalier béton suivant plan de réservation LOT 04 > Cf. Annexe A1	
14	• Planning prévisionnel pour intervention EUROVIA sur parvis : <u>A partir du 9 mai 2023</u>	

12	► LOT 01 : Le MARCORY	Convocation n° 3	OUI
13	Acceptation des sous-traitants • Entreprise SEM / Travaux d'étanchéité		
14	validation MOA : • Entreprise TBM / Travaux de platelage terrasse R+1		
15	Dossier DC4 déposés en attente d'agrément : • Entreprise SOLARES / Travaux de façade		
16	Réfèrent pressenti : Antonio Da Silva <ADaSilva@solares.fr>		
17	Demande dossiers EXE, avec :		
18	• PLAN EXE RDC : Liaison allège-radier y compris plan de réservation [CVC] au droit de la GT sur local ménage		
19	• COUPE sur complexe d'étanchéité réfléchissante - URGENT -		
20	• Planning d'intervention détaillés par tâches		
21	• Ensemble des fiches produit pour agrément MOE/MOA		

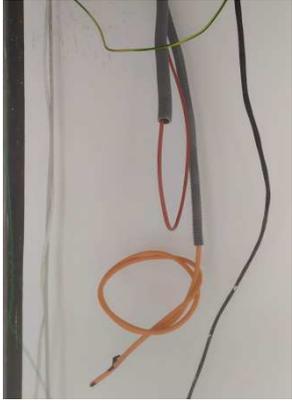22	• Validation Avec Observations du PIC en annexe		
23	• URGENT / Prévoir la protection des ouvrages / Poteaux + ascenseur + escalier (TBM)		
24	<u>DEMOLITION RDC :</u>		
25	• Pris en charge par lot 02, la dépose des menuiseries du RDC débute le 28 février	Réseau CFA ▼	Réseau EP/EU ▼
26	• Réseaux EAU & CFA à conserver pendant les travaux de démolition intérieure suivant les repérages in situ par Lot 04.		
27	► LOTS 02 : France-Aluminium	Convocation n° 3	OUI
28	• INTERVENTION pour dépose des menuiseries RDC le, 28/02/2023		
29	• Définir une date d'intervention pour la dépose/pose du châssis R+1		
30	• Détail de l'ossature métallique (support d'étanchéité réfléchissante) Façade EST		
31	• Demande du détails de fixation des rails du batardeau y compris de l'écarteur pour une pose en applique après les paumelles des baies de passage.		
32	• Fournir Plans-coupe des menuiseries en version pdf pour diffusion BET & CT pour VISA		
33	► LOT 03 : MEDITRAG	Convocation n° 3	OUI
34	• Dossiers EXE en attente, avec détails de renforts pour fixation des sanitaires et notamment :		
35	Local ménage > Doublage en contre-plaqué (dim. 60 x h.100 / ép..18 mm) derrière placo		
36	WC > Pose contre-plaqué (ép..12 mm) derrière et/ou en remplacement placo		
37	• FOURNIR l'ensemble des fiches produit y compris peinture		
38	• Planning d'intervention détaillés par tâches. Ref. TRESPA Aluminium Grey - M51.0.1		
39	► LOT 04 : CAMBORDE-GAYRAUD	Convocation n° 3	OUI
40	<u>GAYRAUD :</u>		
41	• Fournir Plans CFO-CFA / SSI en version pdf pour diffusion BET & CT pour VISA		
42	<u>CAMBORDE :</u> • Dossier EXE en attente de visa		
42	• DEMANDE AVENANT pour reconditionnement des liaisons frigo. Niveau Yacht-club		
43	• Demande Planning d'intervention détaillés par tâches.		

► DOCUMENTS FOURNIS

*BPE - Bon pour Exécution / VAO - Visa Avec Observation - R - Refusé

Lot	Entreprise	Document	Etat*			
			BPE	VAO	R	
L01	Le MARCORY	<ul style="list-style-type: none"> Plans Installation Chantier (PIC) Fiches produits de façade 	visé		x	
			En attente visa			
L02	France Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> Plans coupe des menuiseries RDC Version papier 	En attente visa			
L03	MEDITRAG	<ul style="list-style-type: none"> Echantillon Sol GTI max - Réf.0259 Grécale - 	Agrément en cours	x		
L04	CAMBORDE	<ul style="list-style-type: none"> Fiches produits CVC & Plomberie Plan sanitaires pour renfort cloison Plan Clim pour réservation réseaux Plan Clim pour retombée faux plafond Plan VMC pour entrées d'air 	En attente Visa et agrément			
					x	
					x	
					x	
	GAYRAUD	<ul style="list-style-type: none"> Ensemble Plans CFO-CFA-SSI (x3 niveaux) Version papier 				

état pressenti *

A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	23POR01_PALAVAS_-BESOINS DIVERS RDC
A2	20230228_23POR01-PALAVAS_PIC-VAO
A3	
LIEN	https://photos.app.goo.gl/ZHdLq3KJQgs9fvom?
PHOTOS du : Lundi 27/02/2023	
▼ 01	▼ 02
	
▼ 03	▼ 04
	
01	Marché n°22POR35 ► Travaux VRD avec passage de gaines CFO / CFA devant GT du local ménage
02	Marché n°22POR35 ► Protection provisoire en attente de réparation sur évacuation EV endommagée
03	Reprise de la protection sur escalier
04	Protection des poteaux en attente
